

Hinweis

- Die Kennzeichnung der Pflanzstellen wird vom AG abgenommen.
- Beim Herstellen der Pflanzlöcher werden die vom AG beauftragten Untersuchungen auf das Vorhandensein von Kampfmitteln und die archäologische Baubegleitung gleichzeitig durchgeführt.
- Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BÜ fortzusetzen.

Maßnahme A/E 2

Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt		2.1	2.2	Gesamt
Code	Pflanze	Stück	Stück	Stück
Aps	Acer pseudoplatanus	5	-	5
Bpe	Betula pendula	6	-	6
Ma	Malus 'Hasenkopf'	-	10	10
Ma	Malus 'Kaiser Wilhelm'	-	9	9
Ma	Malus 'Landsberger Renette'	-	6	6
Ma	Malus 'Prinzenapfel'	-	7	7
Ma	Malus 'Roter Eiserapfel'	-	9	9
Pr	Prunus 'Büttner's Rote Knorpelkirsche'	-	7	7
Pr	Prunus 'Dönissens Gelbe Knorpelkirsche'	-	4	4
Pr	Prunus 'Große Schwarze Knorpelkirsche'	-	6	6
Pr	Prunus 'Haus-Zwetsche'	-	6	6
Pr	Prunus 'Mirabelle von Nancy'	-	9	9
Py	Pyrus 'Gellert's Butterbirne'	5	-	5
Tpl	Tilia platyphyllos	5	-	5
		21	73	94

- Vegetationsfläche mähen **5.040 m²**
- Blatt 2.1: 1.400 m²
- Blatt 2.2: 3.640 m²
- Suchgraben zur Leitungserkundung gemäß Plandarstellung herstellen, bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 2,50 m zum Baumstandort Wurzelsperre einbauen
- Pflanzstandorte an der mit roten Grenzpunkten markierten Flurstücksgrenze gemäß Plandarstellung kennzeichnen
- regelmäßiger Abstand in der Reihe 8,00 m, Abweichungen gemäß Plandarstellung
- Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlmausschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schilfrohmatten, Dreibeck, Pflanzscheibe mulchen
- Begrenzungspfähle im Absand von 2,00 m hinter dem Baum, Abweichungen gemäß Plandarstellung
- Greifvogelstangen

Legende

Pflanzarbeiten

- Einzelbaum / Baumreihe
- Baum fällen
- Suchgraben
- Wurzelsperre
- Böschungssicherung
- Begrenzungspfahl
- Greifvogelstange
- Mähfläche

Nachrichtlich

- Grenzpunkt
- nicht mehr vorhandener Bestand
- Sicherheitsstreifen zur Versorgungsleitungen
- Gasleitung (EWE Netz)
- Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
- Elektroleitung MS (E.DIS)
- Elektroleitung NS (E.DIS)
- Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)

Die Freigabe zur Bauausführung erfolgt gemäß §4 FStrG und unbeschadet der vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfenden Übereinstimmung mit dem Bauvertrag

Alle Maße und Höhen sind auf der Baustelle nachzuprüfen

Maßnahmen

- A 3/2.2**
 - Nr. der Teilfläche
 - Nr. der Teilmaßnahme
 - Nr. der Maßnahme
 - Bezeichnung des Maßnahmentyps
- A - Ausgleichsmaßnahme
E - Ersatzmaßnahme
G - Gestaltungsmaßnahme
V - Vermeidungsmaßnahme

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

	Landesbetrieb Straßenwesen	Datum	Name	Unterschrift
	Dezernat Planung Ost	bearbeitet		
	Müllroser Chaussee 51	gezeichnet		
	15236 Frankfurt (Oder)	geprüft		
Ausf.-Nr.:				

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LAND BRANDENBURG	Straße: Abschn.-Nr.: bis von km: Station: bis km:	Unterlage / Blatt-Nr.: 2.1 Pflanzplan A/E 2 Reitwein, Podelziger Weg Baumpflanzung Maßstab: 1 : 500
-------------------------	---	---


Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
B 112 Radweg OA Podelzig - OE Rathstock
Pflanzmaßnahmen trassenfern

aufgestellt: Dezernat Planung Ost	Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Frankfurt (Oder) Zur Bauausführung freigegeben Frankfurt (Oder), den
	i.A.

Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.

Hinweis

- Die Kennzeichnung der Pflanzstellen wird vom AG abgenommen.
- Beim Herstellen der Pflanzlöcher werden die vom AG beauftragten Untersuchungen auf das Vorhandensein von Kampfmitteln und die archäologische Baubegleitung gleichzeitig durchgeführt.
- Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BÜ fortzusetzen.

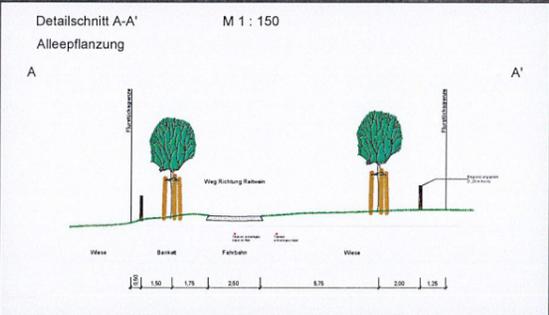

Maßnahme A/E 2 Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt	Code	Pflanze	Qualität	2.1	2.2	Gesamt
				Stück	Stück	Stück
Apa	Acar pseudoplatanus	H 3kv. mDb 14-16	S	5	-	5
Bpe	Betula pendula	H 3kv. mDb 14-16	S	6	-	6
Ma	Malus 'Hasenkopf'	H 3kv. mDb 12-14	-	10	10	20
Ma	Malus 'Kaiser Wilhelm'	H 3kv. mDb 12-14	-	9	9	18
Ma	Malus 'Landsberger Renette'	H 3kv. mDb 12-14	-	6	6	12
Ma	Malus 'Prinzenapfel'	H 3kv. mDb 12-14	-	7	7	14
Ma	Malus 'Roter Eiserapfel'	H 3kv. mDb 12-14	-	9	9	18
Pr	Prunus 'Büttner's Rote Knorpelkirsche'	H 3kv. mDb 12-14	-	7	7	14
Pr	Prunus 'Dürrensens Gelbe Knorpelkirsche'	H 3kv. mDb 12-14	-	4	4	8
Pr	Prunus 'Große Schwarze Knorpelkirsche'	H 3kv. mDb 12-14	-	6	6	12
Pr	Prunus 'Haus-Zwetsche'	H 3kv. mDb 12-14	-	6	6	12
Pr	Prunus 'Mirabelle von Nancy'	H 3kv. mDb 12-14	-	9	9	18
Py	Pyrus 'Gellert's Butterbirne'	H 3kv. mDb 12-14	S	5	-	5
Tpl	Tilia platyphyllos	H 3kv. mDb 14-16	S	5	-	5
				21	73	94

- Vegetationsfläche mähen 5.040 m²
- Blatt 2.1: 1.400 m²
- Blatt 2.2: 3.640 m²
- Suchgraben zur Leitungserkundung gemäß Pflandarstellung herstellen, bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 2,50 m zum Baumstandort Wurzelsperre einbauen
- Pflanzstandorte an der mit roten Grenzpunkten markierten Flurstücksgrenze gemäß Pflandarstellung kennzeichnen
- regelmäßiger Abstand in der Reihe 8,00 m, Abweichungen gemäß Pflandarstellung
- Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlmüsserschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schutzmatte, Diebstahl, Pflanzscheibe mähen
- Begrenzungspfähle im Abstand von 2,00 m hinter dem Baum, Abweichungen gemäß Pflandarstellung
- Greifvogelstangen

Legende

Pflanzenarbeiten

- Einzelbaum / Baumreihe
- Baum fällen
- Suchgraben
- Wurzelsperre
- Böschungssicherung
- Begrenzungspfahl
- Greifvogelstange
- Mähfläche

Nachrichtlich

- Grenzpunkt
- nicht mehr vorhandener Bestand
- Sicherheitsstreifen zu Versorgungslinien
- Gasleitung (EWE Netz)
- Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
- Elektroleitung MS (E.DIS)
- Elektroleitung NS (E.DIS)
- Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)

Maßnahmen

- Nr. der Teilfläche
- Nr. der Teilmaßnahme
- Nr. der Maßnahme
- Bezeichnung des Maßnahmentyps
- A - Ausgleichsmaßnahme
- E - Ersatzmaßnahme
- G - Gestaltungsmaßnahme
- V - Vermeidungsmaßnahme

1	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LS Landesbetrieb Straßenwesen
 Dezernat Planung Ost
 Mühlroser Chaussee 51
 15236 Frankfurt (Oder)

Datum: _____ Name: _____ Unterschrift: _____

Ausf.-Nr.: _____

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LAND BRANDENBURG

Strasse: _____ Abschn.-Nr.: _____ bis _____ Station: _____ von km: _____ bis km: _____

Linienreife / Blatt-Nr.: 2.2
 Pflanzplan A/E 2
 Reitwein, Podelziger Weg
 Baumpflanzung

M Maßstab: 1:500

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
 B 112 Radweg OA Podelzig - OE Rathstock
 Pflanzmaßnahmen trassenfern

aufgestellt: Dezernat Planung Ost

Landesbetrieb Straßenwesen
 Brandenburg, Dienststelle Frankfurt (Oder)
 Zur Bauausführung beigegeben
 Frankfurt (Oder), den _____

IA

Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.
